





Отчет АППЗ расхода  
материалов на содержание МКД 2024г.

№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол- во	Фото
Новгородский д. 8						
февраль						
1	02.02.24	2 пар., вент камера, программирование и замена пожарного датчика	Датчик ИП 212-64	шт	1	
2	28.02.24	3 пар., 21 эт., замена датчика дыма	Датчик ИП 212-64	шт	1	
март						


1	01.03.24	1 пар., 17 эт., замена датчика дыма	Датчик ИП 212-64	шт	1	
парель						
1	08.04.24	1 пар., замена	Адресная метка АМ-4 прот. R3	шт	1	

Начальник участка  
должность

\_\_\_\_\_   
подпись

расшифровка

Отчет по кровле расхода  
материалов на содержание МКД 2024 г.




№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол- во	Фото
Новгородский д. 8						
март						
1	04.03.24	3 пар, установка вентиляционного зонта	Зонт вентиляционный 110 мм	шт	1	

Начальник участка  
должность






\_\_\_\_\_   
подпись





\_\_\_\_\_   
расшифровка







Отчет по общему строю расхода  
материалов на содержание МКД 2024 г.

№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол- во	Фото
<b>Новгородский д. 8</b>						
1	09.01.24	3 пар, 11 эт., балкон, удаление надписи	Ветош растворитель	м литр	0,01 0,05	
<b>февраль</b>						
1	29.02.24	5 пар., 23 эт., удаление надписей	Ветошь растворитель	м литр	0,16 0,05	
<b>март</b>						
1	26.03.24	5 пар., 19 эт., квартирный холл, ремонт	дюбель гвоздя 6x60 мм декоративная штука плитка 10x30 плиточный клей 200 гр	шт кг шт кг	2 0,5 0,5 0,2	










						
2	25.03.24	3 пар., вход в парадную, удаление надписей	Ветош растворитель	м литр	0,01 0,05	   

						 
апрель						
1	18.04.24	3 пар., 13 эт., метал дверь, удаление надписей	Ветош растворитель	м литр	0,04 0,03	   

2	18.04.24	2 пар, 10,11 эт., ремонт плитфи	Плитка керамическая Клей плиточный	м2 кг	0,028 0,4			
ИЮЛЬ								
1	02.07.24	4 пар., удаление надписей	Ветош растворитель	м литр	0,04 0,05			
								







						
2	02.07.24	4 пар., удаление надписей	Краска акриловая	литр	5	

3	03.07.24	5 пар., удаление надписей	Ветош растворитель	м литр	0,02 0,06	
---	----------	---------------------------	-----------------------	-----------	--------------	---

4	03.07.24	4 пар., удаление надписей	Ветош растворитель	м литр	0,01 0,02	     
---	----------	---------------------------	-----------------------	-----------	--------------	---


5	03.07.24	5 пар., 13 эт., ремонт стяжки пола балкона	ЦПС	кг	5	
6	03.07,24	5 пар., 2 эт., покраска стен	Краска акриловая	литр	1	









							
7	03.07.24	5 пар., 7,13,14,15 эт., лифт холл окраска стен, 18,19 эт, пож. Лестница, ремонт ступеней	Краска акрилшловая ЦПС	кг кг	0,2 2		
							




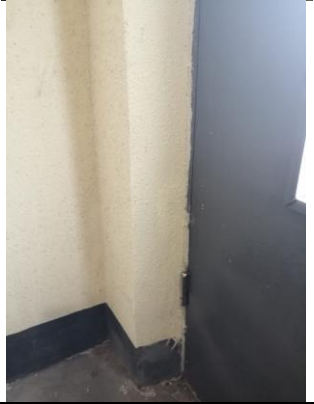




						
--	--	--	--	--	--	---



						     
--	--	--	--	--	--	---

						 
8	04.07.24	5 пар., 3,4,6,8 эт., покраска стен	Краска акрил	кг	3,7	   



						     
--	--	--	--	--	--	---

							
9	10.07.24	5 пар., 23 эт, тамбур, покраска стены	Краска акрил	кг	2		
							




10	17.07.24	2 пар., вход в парадную, ремонт тротуарной плитки	Б/У песок			
август						
1	01.08.24	5 пар, 13 эт, ч.л., 16 эт., лифт холл, окраска стен	Краска акрил	кг	4	

								  <div style="display: flex;">   </div>
<b>сентябрь</b>								

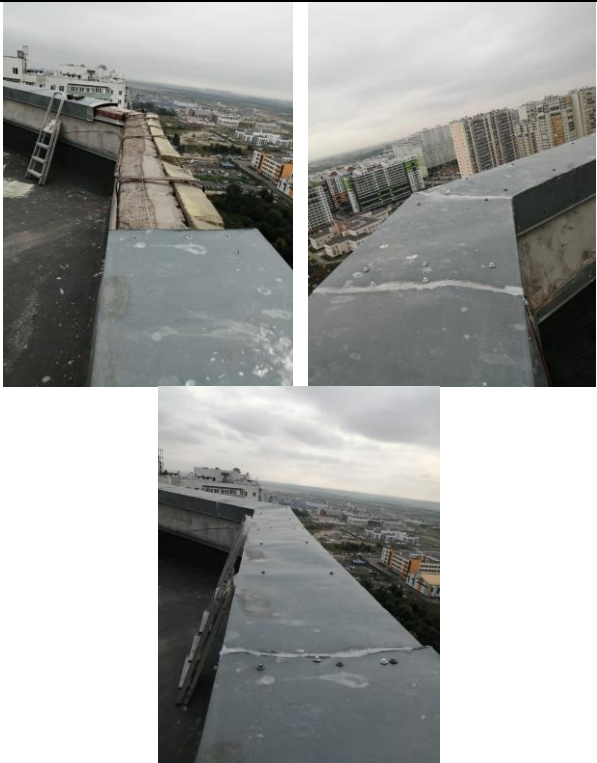1	16.09.24	4 пар., кровля, ремонт отлива на парапете	Само рез кровельный 16 мм Само рез кровельный 25 мм герметик полиуретановый	шт шт мл	16 5 300	
ноябрь						
1	18.11.24	4 пар., 23,4 эт., удаление граффити	Ветош растворитель	м литр	0,01 0,2	



2	18.11.24	1 пар., 1 эт., очистка поручня	Ветош растворитель	м литр	0,01 0,2	
---	----------	--------------------------------	-----------------------	-----------	-------------	--

Начальник участка  
*должность*

\_\_\_\_\_  
*подпись*




*расшифровка*


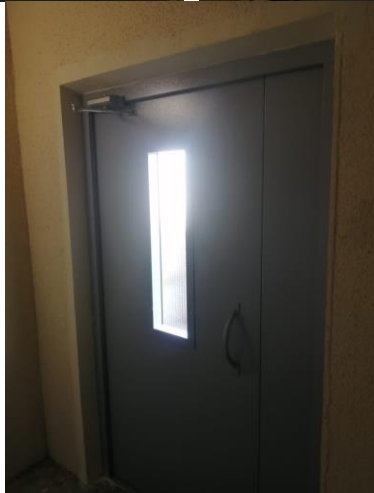
Отчет по общему строю расхода  
материалов на текущий ремонт МКД 2024 г.


№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Фото
Новгородский д. 8						
февраль						
1	14.02.24	3 пар, 11 эт., тамбурная дверь, покраска деревянной двери	Краска акриловая серая	литр	0,3	
март						
1	28.03.24	кв 536, ремонт отслоения штукатурки фасада	Клей пена Дюбель для теплоизоляции	литр шт	0,75 80	

							
--	--	--	--	--	--	--	---





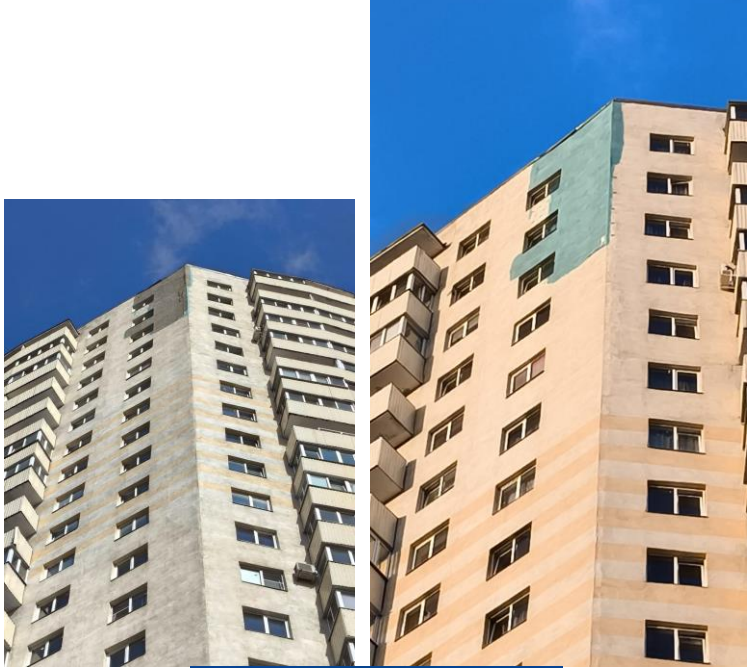

апрель

1	25.04.24	ИТП 1,2,3, установка вентиляторов	вентилятор осевой мет. 160 мм труба вентиляционная 160 мм пена монтажная	шт м/п гр	3 2 200	  
май						

1	07.05.24	4 пар., 2-25 эт., восстановление откосов	Гип рок Рот банд Пена монтажная Саморез4,5х75 Саморез 3,25х55 Дюбель нейлон 6 мм Дек/штукатурка	м2 кг бал шт шт шт кг	3,75 25 1 30 30 60 6	 
август						

1	30.08.24	кв 536, оштукатуривание фасада	Дюбель для теплоизоляции Сетка малярная Штукатурка Грунт Штукатурка декоративная колер	шт м/п кг кг кг гр	300 50 200 15 200 250	
декабрь						



1	03.12.24	кв 327,328, фасадная стена над балконом	грунт бетоноконтакт Герметик	1,2 2	кг тубы	     
2	28.12.24	МОП 1,2,3.4 парадные, косметический ремонт	Шагрень краска Стены – 2 921,96 м2 Потолок - 1 175,84 м2 Масляная краска Торец лестницы - 91,36 Сапожок по стенам - 675,8 м2	кг кг  кг  кг	584,392 235,168  13,704  101,37	

			Шпаклёвка финишная 297м2 Грунтовка 297м2	кг Литр	445,5 36	
--	--	--	--	------------	-------------	--



Начальник участка  
*должность*



\_\_\_\_\_  
*подпись*



*расшифровка*









Отчет по сантехнике расхода  
материалов на содержание МКД 2024 г.




№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол- во	Фото
Новгородский д. 8						
январь						
1	07.01.24	пом.3Н., замена крана перед радиатором	Кран шаровой ½ в/н	шт	1	
2	14.01.24	ИТП 1. Замена обратного клапана	Клапан обратный 40 мм нерж. Болт М16 80 мм Гайка М 16	шт шт шт	1 4 4	

3	15.01.24	кв 296, замена отсечного крана	Кран шаровой ½” в/н	шт	1	
4	16.01.24	кв 265, замена участка трубопровода ГВС обратка в.з.	Труба ППР арм стекл. 25 мм Муфта ППР соедин. 25 мм Американка 25 x 1” x 25 мм	м/п шт шт	0,4 3 1	



5	24.01.24	кв 159, замена разъёмного соединения	Американка 32мм х 1" вн.	шт	2	
6	26.01.24	кв 449, замена участка труба обратки ГВС в.з	Труба ППР арм стекл. 32 мм Муфта соедин.ППР 32 мм Американка 32 мм х 1 1/4" х 32 мм	м/п шт шт	0,4 3 1	
7	25.01.24	5 пар., 23 эт., квартирный холл, устранение течи (сварочные работы)	Электрод ОК 46 3 мм	шт	2	


8	25.01.23	1 пар., 2 ст., ЦО в.з. замена участка трубопровода(сварочные работы)	Электроды Труба сталь 1"	кг м/п	0,3 0,4	
9	30.01.24	2 пар.,3 ст., подвал, замена отсечного крана н.з. ГВС	крана шаровой со сгоном 3/4" комбимуфта ППР 25 мм 3/4"нар комбимуфта ППР 25 мм 3/4".вн	шт шт шт	1 1 1	
февраль						
1	05.02.24	кв 298, замена участка трубы ГВС обратка	Труба ППР арм стекл. 25 мм Муфта ППР соедин. 25 мм Американка 25 x 1" x 25 мм	м/п шт шт	0,3 3 1	

2	08.02.24	Пом 21Н, ремонт трубопровода ГВС	Муфта ППР соединит. 32 мм	шт	2			
3	06.02.24	Подвал, 2 пар., розлив ГВС, замена участка трубопровода	Угол ППР. 45 гр./90 мм муфты соединит. 90 мм. муфты переходная. 90x75 мм. Трубы ППР арм. стекл. 90 мм	шт шт шт м/п	2 1 1 1			
4	19.02.24	кв 547, замена участка трубопровода ГВС	америка ППР 32 мм х 1" вн угол ППР 90 гр х 32 мм муфта ППР соедин 32 мм труба ППР арм. стекл. 32 мм	шт шт шт м/п	1 1 1 0,2			


5	21.02.24	кв 616, замена отсечного крана	Кран шаровой ½"	шт	1	
<b>март</b>						
1	18.03.24	кв.545, замена участка трубопровода ГВС	америка ППР 32 мм х 1" вн угол ППР 90гр х 32 мм муфта ППР соедин 32 мм труба ППР арм сткл. 32 мм	шт шт шт м/п	2 1 2 0,6	 
2	21.03.24	Подвал, 1 пар., розлив ГВС коммерция, ремонт трубопровода	труба ППР арм сткл. 40 мм труба ППР арм сткл. 20 мм тройник ППР 40х20х40 мм муфта ППР соедин 40 мм муфта ППР соедин 20 мм угол ППР 90гр х 20 мм	м/п м/п шт шт шт шт	0,2 0,1 2 2 1 1	






3	21.03.24	кв.164 замена отсечного крана	Кран шаровой ½ в/н	шт	1	
4	27.03.24	кв.522, замена отсечного крана и американок на ПС	Кран шаровой ½ в/н америка ППР 32 мм х 1” вн	шт шт	1 2	

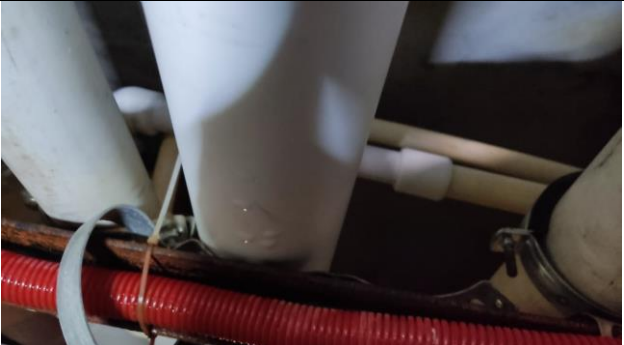

5	27.03.24	4 пар., 4 ст. ГВС замена отсечного крана	крана шаровой со сгоном 1" комбимуфта ППР 32 мм 1" нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн	шт шт шт	1 1 1	
---	----------	---	---	----------------	-------------	--


**апрель**

1	08.04.24	2 пар., подвал, н.з. ГВС, замена трубы	угол ППР 45гр x 32 мм муфта ППР соедин 32 мм труба ППР арм сткл. 32 мм	шт шт м/п	2 2 0,4	
---	----------	---	--	-----------------	---------------	--




							
<b>май</b>							
1	02.05.24	кв.264, ремонт стояка ГВС, замена отсечных кранов	Кран шаровой ½ в/н Муфта ППР соедин. 32 мм Американка 32 x 1" x 32 мм	шт шт шт	2 2 1		 



								
2	16.05.24	кв.558, ремонт стояка ГВС	америка ППР 32 мм х 1'' вн угол ППР 90гр х 32 мм муфта ППР соедин 32 мм труба ППР арм сткл. 32 мм	шт шт шт м/п	1 1 1 0,3			


3	27.05.24	Пом 28 Н, ремонт факовой трубы 110 мм ПВХ				
---	----------	---	--	--	--	--

**июнь**


1	10.06.24	4 пар., подвал, розлив ГВС, ремонт трубопровода	угол ППР 45гр x 50 мм муфта ППР соедин 50 мм труба ППР арм сткл. 50 мм	ШТ 2 ШТ 1 м/п 0,4	
---	----------	---	--	-------------------------	--



1	09.07.24	кв 268, замена отсечного крана ХВС	Кран шаровой ½ в/в	шт	1	
2	12.07.24	кв 474, 648, замена отсечного крана	Кран шаровой ½ в/в	шт	2	
3	17.07.24	кв 128,565, Замена американок на ПС	Американка ППР 32 мм x 1"вн	шт	3	
4	17.07.24	1 пар., ст.2, замена отсечного крана	крана шаровой со сгоном 1" комбимуфта ППР 32 мм 1" нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн	шт шт шт	1 1 1	




5	17.07.24	1 пар., замена отсечного крана	крана шаровой со сгоном 3/4" Кран шаровой 1/2 в/в комбимуфта ППР 25 мм 3/4" нар комбимуфта ППР 25 мм 3/4".вн Тройник ППР 25х20х25мм комбимуфта ППР 20 мм 1/2" нар угол ППР 45гр х 32 мм труба ППР арм сткл. 32 мм	шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 м/п 0,4		
---	----------	--------------------------------	--	---	--	--

**август**



1	08.08.24	кв.448, замена отсечного крана	Кран шаровой 1/2 в/н	шт	1	
2	09.08.24	кв.85, замена отсечного крана	Кран шаровой 1/2 в/н	шт	1	
3	22.08.24	кв.554, ремонт трубопровода	труба ППР арм сткл. 32 мм угол ППР 90гр х 32 мм муфта ППР соедин 32 мм америка ППР 32 мм х 1" вн Кран шаровой 1/2 в/в	м/п 0,5 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1		

**сентябрь**








1	17.09.24	кв304, замена отсечного крана	Кран шаровой ½ в/н	шт	1			
2	23.09.24	3 пар., 7 ст., замена участка трубопровода	муфта ППР соедин 32 мм	шт	1			
октябрь								
1	02.10.24	кв.260, замена участка трубопровода ГВС	труба ППР арм сткл. 32 мм угол ППР 90гр x 32 мм муфта ППР соедин 32 мм америка ППР 32 мм x 1” вн	м/п шт шт шт	0,3 1 1 1			






2	30.10.24	Пом. 27Н, замена участка трубопровода ГВС	угол ППР 45гр x 25 мм	шт	2	 
---	----------	---	-----------------------	----	---	---


**ноябрь**


1	01.11.24	Подвал, 3 пар, замена участка трубопровода ГВС	Переход ППР 75x90 Тройник ППР 75x32x75 муфта ППР 75 Труба ППР арм. стекл. 75мм угла ППР 32мм /45гр Труба ППР арм. стекл. 32мм. крана шаровой со сгоном 1" комбимуфта ППР 32 мм 1" нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн	шт 1 шт 1 шт 1 м/п 0,5 шт 2 м/п 0,2 шт 2 шт 2 шт 2	 
---	----------	--	--	--	---

						
2	05.11.24	кв.541, замена участка трубопровода	муфта ППР соедин 32 мм Американка 32 x 1" x 32 мм	шт шт	2 1	 




							
3	05.11.24	4 пар., 25 эт. замена участка трубопровода	Труба ППР арм. стекл. 90мм угла ППР 90мм /45гр	м/п шт	0,5 2		

4	06.11.24	кв.303, замена отсечного крана	Кран шаровой ½ в/н	шт	1	
---	----------	--------------------------------	--------------------	----	---	--


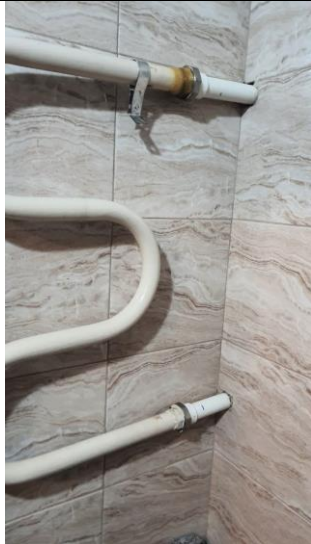


5	14.11.24	1 пар., 5 ст., замена отсечного крана	Кран шаровой ½ в/н	шт	1	
---	----------	---------------------------------------	--------------------	----	---	--



6	14.11.24	1 пар., 4 ст., замена участка трубопровода	Труба ППР арм. стекл. 32мм угла ППР 32мм /45гр муфта ППР соедин 32 мм	м/п шт шт	0,5 2 2	
---	----------	--	---	-----------------	---------------	--





7	20.11.24	4 пар., замена кранов для уборщиц	Кран шаровой ½ в/н	шт	2	
8	21.11.24	кв256, ремонт трубопровода ГВС	Америка латунь 1" в/н комбимуфта ППР 32 мм 1" нар	шт шт	2 2	 



							
9	26.11.24	5 пар., 3 ст, замена участка трубопровода канализации	Отвод 110 мм 45 гр Тройник косой 110 мм х 45 гр.	шт шт	2 1		
декабрь							

1	11.12.24	кв 465, ремонт трубопровода	Американка ППР 32 мм х 1"	шт	2	
2	13.12.24	1 пар., розлив ГВС, ремонт трубопровода	Муфта соединит 63 мм	шт	2	

3	13.12.24	1 пар., 1 ст., замена участка трубопровода	Тройник ППР 25х20х25 муфта ППР 25 угла ППР 25мм /45гр Труба ППР арм. стекл. 25мм. крана шаровой со сгоном 3/4" комбимуфта ППР 25 мм 3/4" нар комбимуфта ППР 25 мм 3/4".вн комбимуфта ППР 20 мм 1/2" нар Кран шаровой 1/2 в/н	шт шт шт м/п шт шт шт шт шт	1 1 2 0,2 1 1 1 1 1			
4	13.12.24	1 пар., 2 ст., замена участка трубопровода	муфта ППР 32 угла ППР 25мм /45гр Труба ППР арм. стекл. 32мм	шт шт м/п	2 2 0,4			




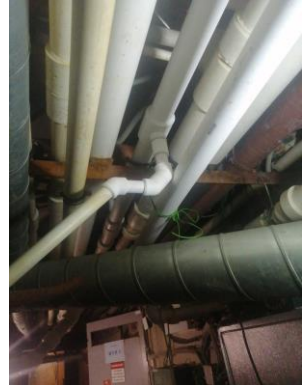
Начальник участка  
должность





\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка





Отчет по сантехнике расхода  
материалов на текущий ремонт МКД 2024г.

<b>№ п/п</b>	<b>дата</b>	<b>Адрес объекта и вид работ</b>	<b>Наименование материала</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>Фото</b>
<b>Новгородский д. 8</b>						
1	06.01.24	4 пар., 6,7 эт. замена участка трубопровода ГВС	Труба ППР арм стекл. 90 мм Муфта соединит. ППР 90 мм	м/п  шт	3  2	 
2	18.01.24	4 пар., подвал, розлив н.з. ГВС, рамена участка трубопровода	Тройник ППР 63х63х63мм тройник ППР 63х32х63мм муфта ППР 32 мм муфта ППР 63 мм труба ППР 63 мм труба ППР 32 мм угол ППР 45° 32 мм	шт шт шт шт м/п м/п шт	1 1 1 2 3 0,3 3	 
<b>март</b>						


1	12.03.24	1 пар., подвал, замена участка трубопровода ГВС в.з.	Труба ППР арм стеклом 90 мм отвод ППР 45гр.90мм муфты соедин. ППР 90.мм	м/п шт шт	2 4 1	
2	11.03.24	Кв 543-548, замена участка трубопровода ГВС	Муфты соединит. ППР 32 мм Угол ППР 90 гр. 32 мм Трубы ППР арм стеклом 32 мм	шт шт м/п	3 3 1	  



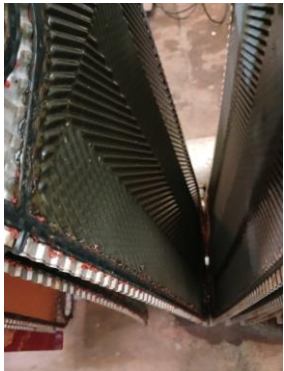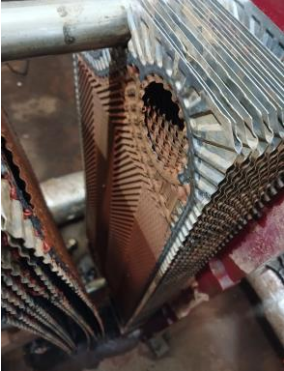


1	16.04.24	Пом. 21Н, замена участка трубопровода ГВС	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Муфты соединит. ППР 32 мм	шт шт	2,5 2	 
май						
1	28.05.24	ИТП 2. Промывка теплообменников ГВС		шт	2	 

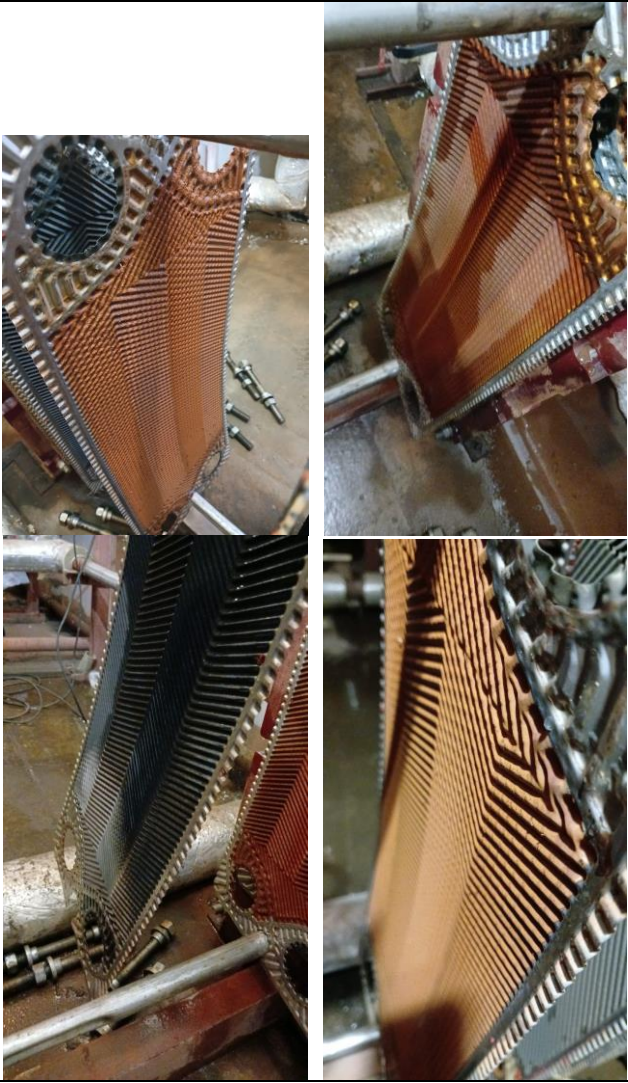

						
--	--	--	--	--	--	---


--	--	--	--	--	--


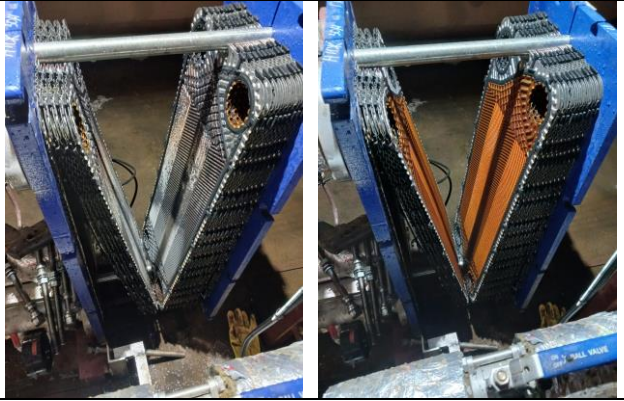


						
--	--	--	--	--	--	---



						
--	--	--	--	--	--	---




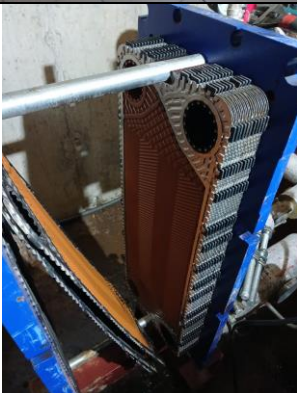

						
--	--	--	--	--	--	---

						
ИЮНЬ						
1	07.06.24	ИТП 3. Промывка теплообменников ГВС				








						
--	--	--	--	--	--	---





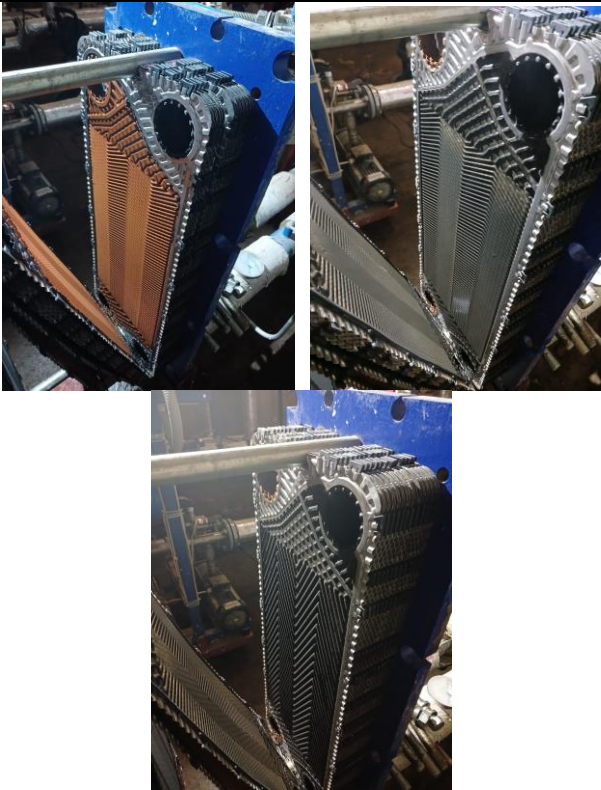

							
2	17.06.24	3 пар., 1,2 эт. замена участка трубопровода ГВС	Трубы ППР арм стеклом 90 мм Муфты соединит. ППР 90 мм	шт шт	4 2	 	
3	17.06.24	ИТП 1, Промывка теплообменников ГВС		шт	2	 	

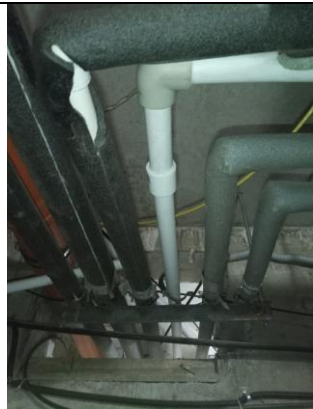


						
--	--	--	--	--	--	---

						
ИЮЛЬ						
1	15.07.24	Подвал, ст 7, замена участка трубопровода ГВС	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Муфты соединит. ППР 32 мм отвод ППР 45гр.32мм	м/п шт шт	4 1 3	
2	12.07.24	кв 634-639, замена участка	крестовина однопл 110x110x50	шт	1	






		фановой трубы с проходом через перекрытие	труба ПВХ 110мм х 2м труба ПВХ 110мм х 1,5м Компенсатор ПВХ 110 мм	шт шт шт	1 1 1	
<b>сентябрь</b>						
1	10-13.09.24	Промывка теплообменников ЦО		шт	6	
2	16.09.24	5 пар., подвал, 2 ст., замена отсечного крана и участка трубопровода	Кран шаровой со сгоном 1" комбимуфта ППР 32 мм 1"нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн Труба ППР арм стекл. 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм	шт шт шт м/п шт	1 1 1 3 1	 
3	17.09.24	кв.542, пом 21Н, замена участка трубопровода ГВС	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Муфты соединит. ППР 32 мм Угол ППР 90 гр. 32 мм	м/п шт шт	5 2 2	










							
ноябрь							
1	06.11.24	4 пар., 7эт., замена участка трубопровода ГВС	Трубы ППР арм стеклом 90 мм Муфты соединит. ППР 90 мм	шт шт	1,5 3		
2	07.11.24	4 пар., 1эт., и подвал, замена участка трубопровода ГВС в.з.	Трубы ППР арм стеклом 90 мм Муфты соединит. ППР 90 мм Угол ППР 45 гр. 90 мм	шт шт шт	4 1 5	 	

						 
3	08.11.24	1 пар.. 1 эт. и подвал, замена участка трубопровода ГВС в.з.	Трубы ППР арм стеклом 90 мм Муфты соединит. ППР 90 мм Угол ППР 45 гр. 90 мм Тройник ППР 90х40х90 мм Переход ППР 40х32мм	шт шт шт шт шт	5 3 7 1 1	   


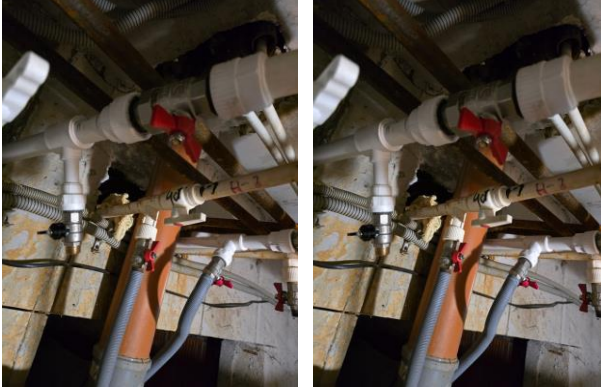



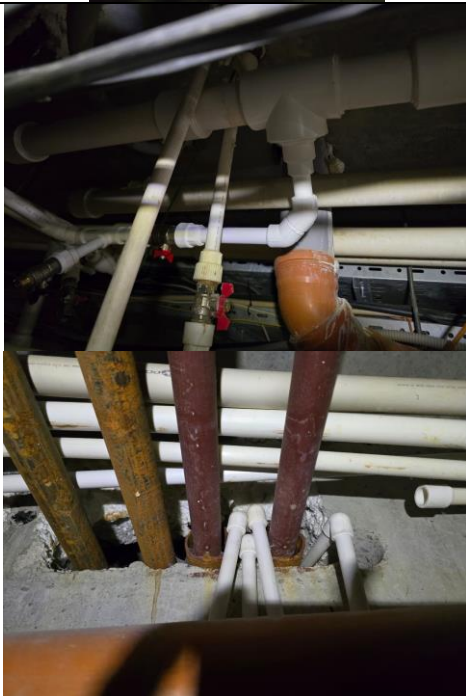
4	14.11.24	1 пар., 2 ст., замена участка трубопровода	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Угол ППР 90 гр. 32 мм	м/п шт	4 4	 
5	16.11.24	1 пар., 7 ст., замена участка трубопровода	Кран шаровой со сгоном 1" комбимуфта ППР 32 мм 1"нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн Труба ППР арм стекл. 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм отвод ППР 45гр.32мм Кран шаровой со сгоном 1/2" комбимуфта ППР 20 мм 1/2"нар тройник ППР 32x20x32	шт шт шт м/п шт шт шт шт шт шт шт	1 1 1 2,5 2 2 1 1 1 1 1	 
6	25.11.24	кв 29,36, замена участка трубопровода с проходом через перекрытие	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Угол ППР 90 гр. 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм	м/п шт шт	2,5 1 2	

							
7	25.11.24	1 пар., 5 ст., замена участка трубопровода	Трубы ППР арм стеклом 25 мм Угол ППР 45 гр. 25 мм Муфта ППР соедин. 25 мм Кран шаровой со сгоном 3/4" Кран шаровой 1/2" в/н комбимуфта ППР 25 мм 3/4" нар комбимуфта ППР 25 мм 3/4" в/н тройник ППР 25x20x25 переход ППР 32x25	м/п шт шт шт шт шт шт шт	2 2 1 1 1 1 1 1		 
8	29.11.24	3 пар., 1 ст., замена участка трубопровода	Кран шаровой со сгоном 3/4" Кран шаровой 1/2" в/н комбимуфта ППР 25 мм 3/4" нар комбимуфта ППР 25 мм 3/4" в/н Трубы ППР арм стеклом 25 мм Угол ППР 45 гр. 32 мм Муфта ППР соедин. 25 мм тройник ППР 25x20x25 переход ППР 32x25	шт шт шт шт м/п шт шт шт шт	1 1 1 1 1,5 2 1 1 1		

							
<b>декабрь</b>							
1	02.12.24	3 пар., 1 ст., замена участка трубопровода	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Угол ППР 45 гр. 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм переход ППР 32х25 Угол ППР 45 гр. 25 мм	м/п шт шт шт шт	4 2 4 1 2		
2	10.12.24	2 пар., 4 ст., замена участка трубопровода	Трубы ППР арм стеклом 32 мм Угол ППР 45 гр. 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм	м/п шт шт	1,5 2 2		



3	13.12.24	1 пар., 7 ст., замена участка трубопровода ГВС подача	Кран шаровой со сгоном 1" Кран шаровой 1/2" в/н комбимуфта ППР 32 мм 1"нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн комбимуфта ППР 20 мм 1/2"нар Трубы ППР арм стеклом 32 мм Угол ППР 45 гр. 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм тройник ППР 32x20x32	шт шт шт шт шт м/п шт шт шт	1 1 1 1 1 2,5 5 1 1	
4	13.12.24	1 пар., 4 ст., замена участка трубопровода ГВС подача, обратка	Кран шаровой со сгоном 1" Кран шаровой 1/2" в/н комбимуфта ППР 32 мм 1"нар комбимуфта ППР 32 мм 1".вн комбимуфта ППР 20 мм 1/2"нар Трубы ППР арм стеклом 32 мм Муфта ППР соедин. 32 мм тройник ППР 32x20x32 Трубы ППР арм стеклом 25 мм тройник ППР 25x20x25 Муфта ППР соедин. 25 мм	шт шт шт шт шт м/п шт шт шт шт шт шт	1 2 1 1 2 2,5 1 1 1 1,5 1 2	

								
5	13.12.24	1 пар., 7 ст., замена участка трубопровода ГВС обратка	Кран шаровой со сгоном 3/4" Кран шаровой 1/2" в/н комбимуфта ППР 25 мм 3/4"нар комбимуфта ППР 25 мм 3/4".вн комбимуфта ППР 20 мм 1/2"нар угол ППР 45 гр. 25 мм Муфта перех.ППР. 63х32 мм тройник ППР 63х63х63 Трубы ППР арм стеклом 25 мм тройник ППР 25х20х25 Муфта ППР соедин. 25 мм Муфта перех.ППР. 32х25 мм	шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	1 2 1 1 2 4 1 1 2,5 1 1 1			





Начальник участка

должность


подпись

расшифровка


Отчет по электрике расхода  
материалов на содержание МКД 2024 г.





№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол- во	Фото
<b>Новгородский д. 8</b>						
1	10.01.24	5 пар., 4 этаж квартирный холл, замена ламп	Лампа Е 27	шт	2	 
2	25.01.24	5 пар, 23 эт., тамбур, замена лампы	Лампа Е 27	шт	1	 




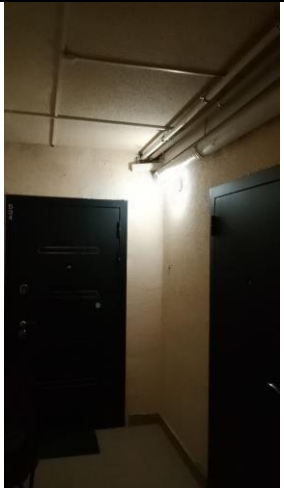






3	29.01.24	Пом 43 Н, в ГРЩ замена вводного автомата	Автомат ИЭК 32 А 3-х полюсной	шт	1	
---	----------	--	-------------------------------	----	---	--




**февраль**



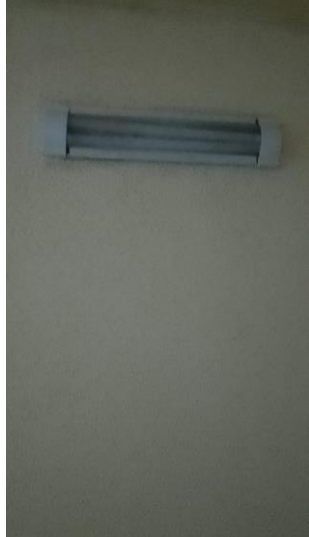

1	01.02.24	1 пар., 12 эт., квартирный холл, замена ламн	Лампа Е 27 20 Вт	шт	2	
2	01.02.24	1 пар., обход, замена ламп, светильников, плафонов	Лампа Е 27 20 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм Светильник 36Вт, 1200 мм плафон шар	шт шт шт шт	11 2 1 3	
3	02.02.24	2 пар., обход, замена ламп, светильников, плафонов	Лампа Е 27 20 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм плафон шар патрон керамический	шт шт шт шт	8 10 4 2	

4	05.02.24	4 пар., 18 эт., лифт холл, замена светильника	лампа лед 10 Вт 600 мм	шт	2	
5	06.02.24	1 пар., 1 эт., лифт холл, замена светильника	Светильник 36Вт, 1200 мм	шт	1	
6	22.02.24	2 пар., 22 эт., квартирный холл, замена ламп	Лампа E27 11 Вт	шт	1	 
7	27.02.24	2 пар., 16 эт., квартирный холл, замена ламп	Лампа E 27 11 Вт	шт	1	 
март						







1	18.03.24	1 пар, замена светильника под козырьком	Светильник СВО12 Вт	шт	1	 
апрель						
1	08.04.24	5 пар., 25 эт., квартирный холл, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	2	 







2	24.04.24	2 пар., 22 эт., квартирный холл, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1		
3	24.04.24	4 пар., 2 эт., лифт холл, замена ламп	лампа лед 10 Вт 600 мм	шт	2		
май							



1	02.05.24	Подвал, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	6	  
---	----------	---------------------	------------------	----	---	--







2	14.05.24	1,2 пар., 21,12, эт., квартирный холл, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	2	 
3	14.05.24	1 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеиватель	Лампа Е 27 11 Вт плафон шар	шт шт	8 2	 


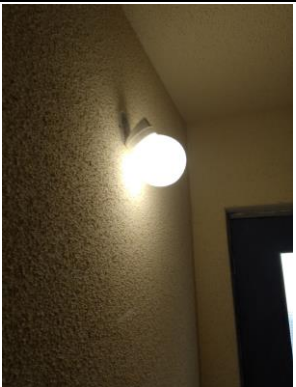












							     
--	--	--	--	--	--	--	---




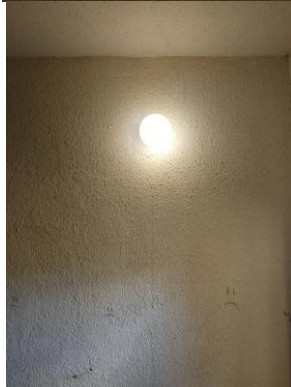


							
4	15.05.24	2 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеивателей, светильников	Лампа Е 27 11 Вт плафон шар светильник лед ДПО 15 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм	шт шт шт шт	10 3 2 4		


								
								
								





							
							
							





						
--	--	--	--	--	--	---





5	17.05.24	3 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеивателей, светильников	Лампа Е 27 11 Вт светильник лед ДПО 15 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм	шт шт шт	3 1 10	   
---	----------	--	--	----------------	--------------	---





								
								







						 
6	17.05.24	4 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеивателей, светильников	Лампа Е 27 11 Вт плафон шар	шт шт	10 5	 




						   
--	--	--	--	--	--	---





						
--	--	--	--	--	--	---











						 	 
--	--	--	--	--	--	---	---





						  
--	--	--	--	--	--	--



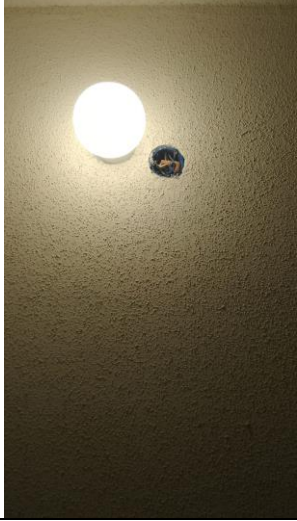

7	20.05.24	4 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеивателей, светильников	Лампа Е 27 11 Вт плафон шар светильник лед ДПО 15 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм	шт шт шт шт	1 1 1 6	   
---	----------	--	--	----------------------	------------------	---


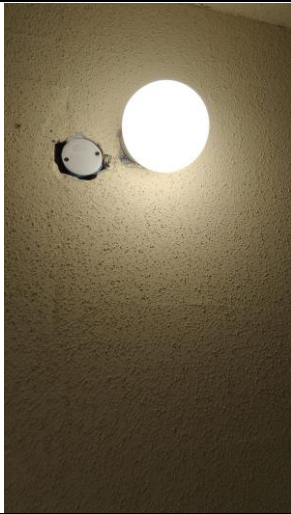
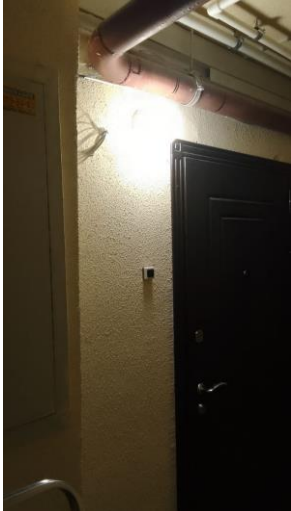

						 	 
--	--	--	--	--	--	---	---







								
								





						 	 
--	--	--	--	--	--	---	---


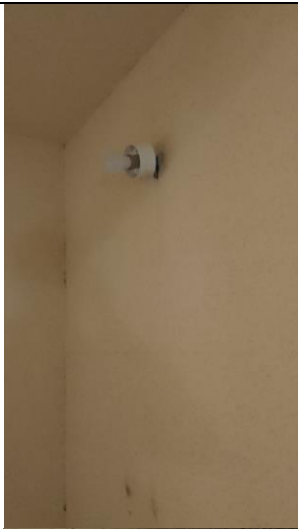


								
8	20.05.24	5 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеивателей, светильников	Лампа Е 27 11 Вт плафон шар лампа лед 10 Вт 600 мм	шт шт шт	6 5 2			



								
								







						   
--	--	--	--	--	--	---





						   
--	--	--	--	--	--	---




								
								





								
								





							
							


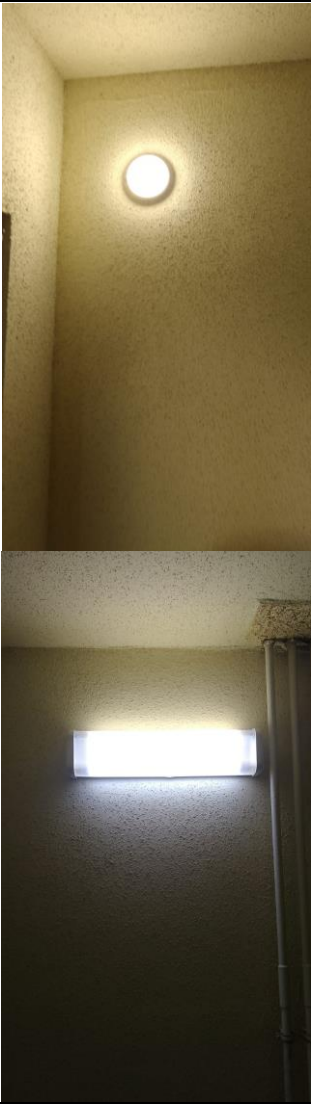






							
							

							  
--	--	--	--	--	--	--	--

9	21.05.24	5 пар., лифт холл, пож лестница, замена ламп и рассеивателей, светильников	Лампа Е 27 11 Вт светильник лед ДПО 15 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм	шт шт шт	4 2 2	   
---	----------	--	--	----------------	-------------	---





							
--	--	--	--	--	--	---	---





								
								





							
сентябрь							
1	26.09.24	1 пар., 12,22 эт., МОП замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	4		




1	08.10.24	Наружное освещение, замена ламп	Лампа Е 60 40 Вт	шт	1	 
2	09.10.24	5 пар., 23 эт., квартирный холл, замена ламп	Лампа Е 60 40 Вт	шт	1	 

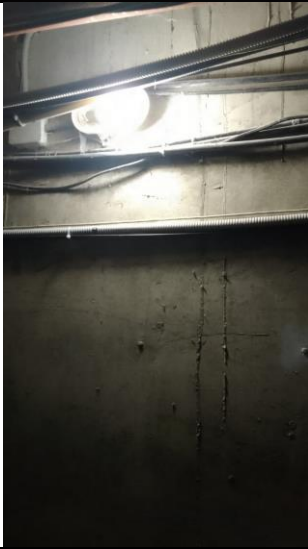
3	11.10.24	Подвал, замена ламп	Лампа Е 60 40 Вт	шт	8	   
---	----------	---------------------	------------------	----	---	--


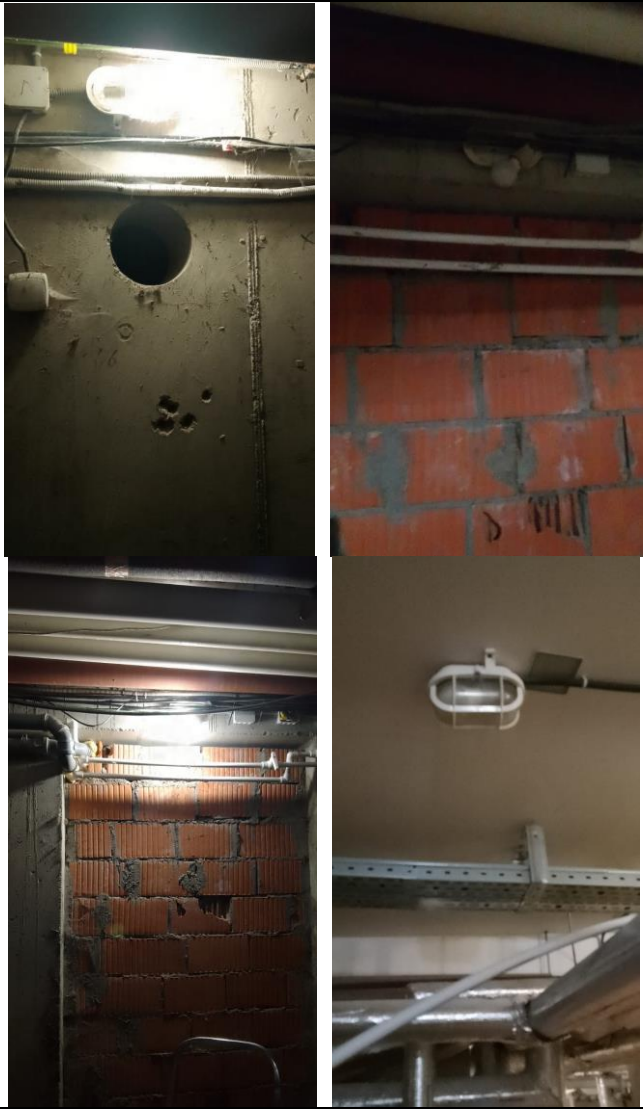


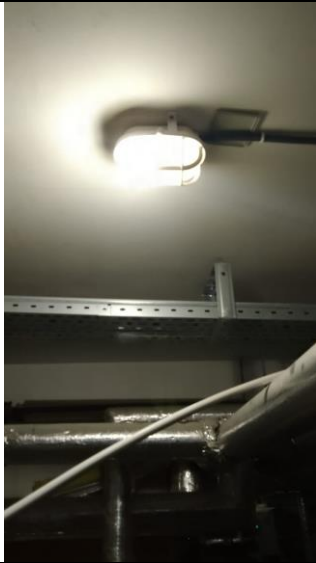

						
--	--	--	--	--	--	---

								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



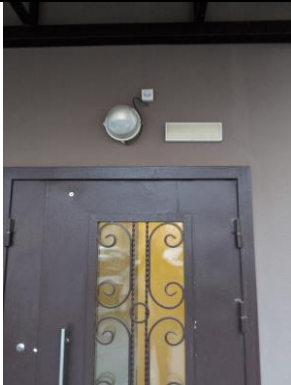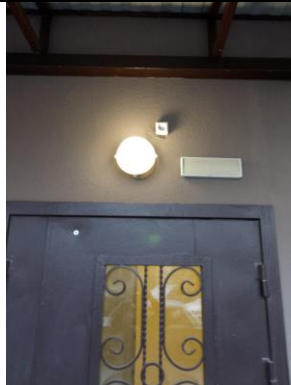




4	15.10.24	6 пар., общедомовое имущество, замена автомата	Автомат однофазн. 32 А	шт	1	
ноябрь						

1	01.11.24	2 пар., 22 эт., МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	2	
---	----------	----------------------------------	------------------	----	---	---





2	01.11.24	3 пар., 1 эт., МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1	 
3	01.11.24	4 пар., 25 эт., замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1	 
4	0.11.24	Детская площадка, замена светильника	Светильник ДКУМ	шт	1	 




5	08.11.24	Подвал, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1		 
6	08.11.24	1 пар., 14 эт., замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	2		 

							
7	25.11.24	4 пар., 13 эт., МОП , замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	2		

							
8	29.11.24	2 пар., Моп, замена ламп и светильников	Лампа Е 27 11 Вт светильник лед 15 Вт лампа лед 10 Вт 600 мм	шт шт шт	15 4 7		






								
								





									
									

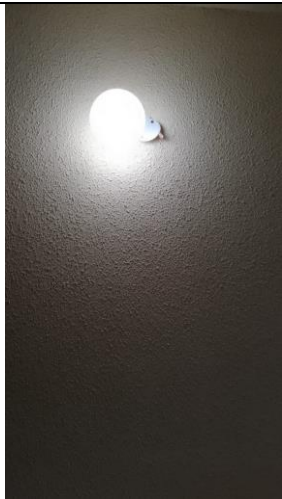



								
								


									
									











								
								







1	03.12.24	1 пар., 19 эт., МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1	 
2	08.12.24	3 пар., 17 эт., замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1	 

3	10.12.24	3 пар., 4 эт., МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	2	   
---	----------	---------------------------------	------------------	----	---	---



4	16.12.24	1 пар., 1 эт. МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1		
5	23.12.24	1 пар., 18 эт., МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	3		


6	23.12.24	4 пар., 5 эт., МОП, замена ламп	Лампа Е 27 11 Вт	шт	1		
---	----------	---------------------------------	------------------	----	---	--	--





Начальник участка  
*должность*

\_\_\_\_\_  
*подпись*

*расшифровка*

Отчет по электрике расхода  
материалов на текущий ремонт МКД 2024г.

<b>№ п/п</b>	<b>дата</b>	<b>Адрес объекта и вид работ</b>	<b>Наименование материала</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>Фото</b>
<b>Новгородский д. 8</b>						
1	16.01.24	Пом. 1.13, монтаж тепловой завесы	Кабель ВВГ 3х1.5 Гофра 20мм Розетка накладная одинарная завеса тепловая endi №11	м/п м/п шт шт	10 10 1 1	
<b>март</b>						
1	19.03.24	ГРЩ 1, ремонт короба	Пластиковая пануль б/у Саморез 13 мм с буром Саморез 32 мм	М2 шт шт	3,8 10 20	
<b>май</b>						

1	13.05.24	ИТП 1, подключение вентиляционного двигателя	кабель 3х1,5 гофра 16 мм вага выключатель	м/п м/п шт шт	5 5 3 1		
октябрь							
1	11.10.24	ИТП 2,3, подключение вентиляционного двигателя	кабель 3х1,5 гофра 16 мм вага выключатель	м/п м/п шт шт	25 25 6 2		

						   
--	--	--	--	--	--	---





						 
--	--	--	--	--	--	---

Начальник участка  
должность

подпись

расшифровка

Отчет слаботочка  
материалов на содержание МКД 2024 г.

№ п/п	дата	Адрес объекта и вид работ	Наименование материала	Ед. изм.	Кол- во	Фото
Новгородский д. 8						
июнь						
1	07.06.24	2 пар, пожарная лестница, ремонт слаботочной системы				
октябрь						
1	17.10.24	5 пар., пожарная лестница, замена блока питания	блок питания FE-S-1,25/12	in	1	

Начальник участка  
должность

\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка
